



北海道

その先の、道へ。北海道

Muroran

Construction
Management
Department

胆振東部地震 被災状況・災害復旧状況

平成30年9月6日3時7分頃
マグニチュード6.7
最大震度7（厚真町）



胆振総合振興局室蘭建設管理部

災害復旧推進室

道路災害復旧工事

- ◆被災箇所数：111箇所（舗装クラック系：56箇所、崩土：32箇所、道路決壊等：23箇所）
- ◆被災額：約55億円



橋梁災害復旧工事

- ◆被災箇所数：19箇所（橋梁上部損傷や支承損傷など）
- ◆被災額：約9億円




被災状況【河川（ダム含む）災害】

河川災害復旧工事

- ◆被災箇所数：26箇所
- ◆被災額：約200億円



地震直後のパトロール

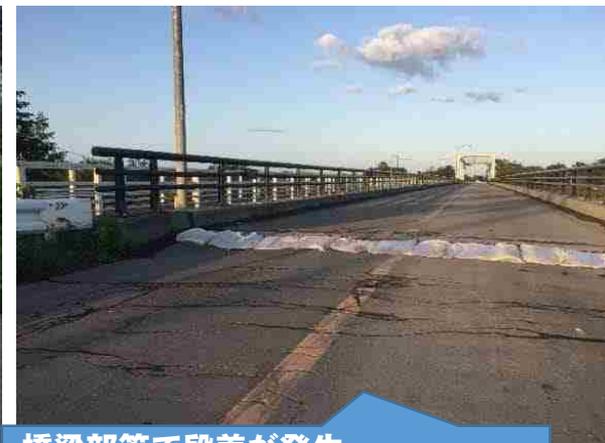

道路パトロール時に、臨機の措置で段差箇所や土のう設置や簡易バリケードを用いて通行止めを実施。

橋梁部等で段差が発生。土嚢を設置して段差を乗り越えて道路パトロールを実施。

通行止め作業



**地震後最大通行止め
15路線20箇所**

地震発生直後にパトロールを行い、被災状況の把握や通行規制を実施。危険箇所や段差箇所には、バリケードや土のうなどを設置。

被災直後の応急作業【段差・陥没対策作業】

応急作業【段差解消】

地震により多くの亀裂や段差が発生。
通行の安全を確保するため、直ちに段差解消などの応急作業を開始した。



道路路面の亀裂処理



橋梁部等の段差解消作業。



道路縦断方向に大きなクラックや陥没が発生



道路横断方向にも亀裂が生じ、路面が盛り上がった状況



厚真町宇隆地区では約1mの道路陥没が発生し、直ちに応急作業を実施

被災直後の応急作業【道路啓開作業】

道路啓開作業

地震による斜面崩壊のため道路上に大量の崩落土が堆積。
通行を確保するため重機やダンプトラックを用いて除去作業を実施。

