

令和3年度(2021年度)公共事業再評価調査

基準年月日 令和3年8月1日

Table with multiple sections: I. 基本事項 (標準日時点), II. 公共事業評価経過, III. 事業採択前の状況, IV. 事業の実施状況. Includes details on project costs, progress, and evaluation results.


V 評価							
1. 必要性	●現況排水路は、フルーム水路等により葺工整備されているが、流域開発等の社会状況の変化に対して十分な排水能力がないため、排水路周辺では冠水被害等が発生しており、今後も周辺農地および隣接する市街地に重大な被害をおよぼすことが予想されるため、事業の必要性に変化はなく、着実に事業の推進を図る必要がある。						
	a	a：事業の必要性に変化はなく予定どおり事業を推進する。 b：着工後の状況変化により事業計画の変更が必要である。 c：着工後の状況変化により事業推進の是非を判断する必要がある。					
2. 事業を推進する上での課題	(1) 環境上の配慮及び課題 ●工事の際、掘削土や汚染水の流出に配慮している。また、作業機械については低騒音・低振動・低排出ガス対応の機種使用に努め、周辺環境に配慮している。						
	(2) 事業推進に対する住民の動向 ●事業着手以降、上川地方総合開発期成会を通じて整備促進要望が行われている。						
	(3) その他の課題 ●特になし						
3. 事業達成の見込み	今後の事業実施に当たって特に大きな支障や課題はないが、予定年度での完了に向けて今後は要望とおりの予算を配当する必要がある。						
	a	a：現時点では事業の進捗に影響する課題はなく、達成が見込まれる。 b：課題はあるものの達成は可能である。 c：大きな課題があり達成には相当の困難が予想される。					
4. 対処方針	事業の必要性に変化はなく、地元からの早期完成要望も受けているため、令和5年度の完成を目指して事業を継続する。						
	a	a：継続 b：終了 c：休止 d：中止					
	事業期間変更の有無	有	事業費変更の有無	有	事業内容変更の有無	目的・規模等に係る変更 無	左記以外の変更 有
VI 備考							
1. 評価履歴	事前評価：該当なし 再評価：該当なし						
2. その他の取組事項							

補足資料


VII 事業計画変更										(単位：百万円)				
事業年度	再評価 又は当期	事業採択	着手	変更年度	完了予定	事業年度	事業費	総事業費(a)	道負担額	当該年度事業費	累計事業費(b)	進捗率(b)/(a)	変更理由・内容	
													経年	数
事業年度		H28 (2016)	H28 (2016)		H34 (2022)	経年		850	281					
変更①		H28 (2016)	H28 (2016)	H30 (2018)	H34 (2022)	数		1,000	330					
変更②				R1 (2019)	R4 (2022)			1,018	336					
変更③	1回目			R2 (2020)	R5 (2023)			1,270	419	390	853	67%		
変更④														
変更⑤														
変更⑥														
変更⑦														
変更⑧														
変更⑨														
変更⑩						5								
変更理由・内容		変更①：事業費の変更 環境影響調査の増に伴う測量設計費の増額 ・住民説明会において整備計画を説明した結果、建物調査等の要望を受けたため、住民会及び町と協議し確認した結果、環境影響調査を実施することによる測量設計費の増額 変更②：事業費の変更 ・調査設計により、ルート変更に伴う延長減による事業費の減額 ・自然増に伴う事業費の増額 変更③：事業費の変更 ・水路の安全対策に安全柵を設置する計画であったが、沿線住宅に小学生・未就学児が多く居住していることから防護蓋へ変更したことによる事業費の増額 事業期間の延伸 ・排水路に隣接する日の出公園の再整備構想(R2年再整備構想発案)があり、R3年度中に町の整備方針が確定するため、町の整備方針確定後、再度一部の設計を検討する必要があることから、1年事業期間を延伸												

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図5000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平28情標、第44号)」

# 上富良野地区 道営農地防災事業費(農村地域防災減災事業(用排水施設整備事業))

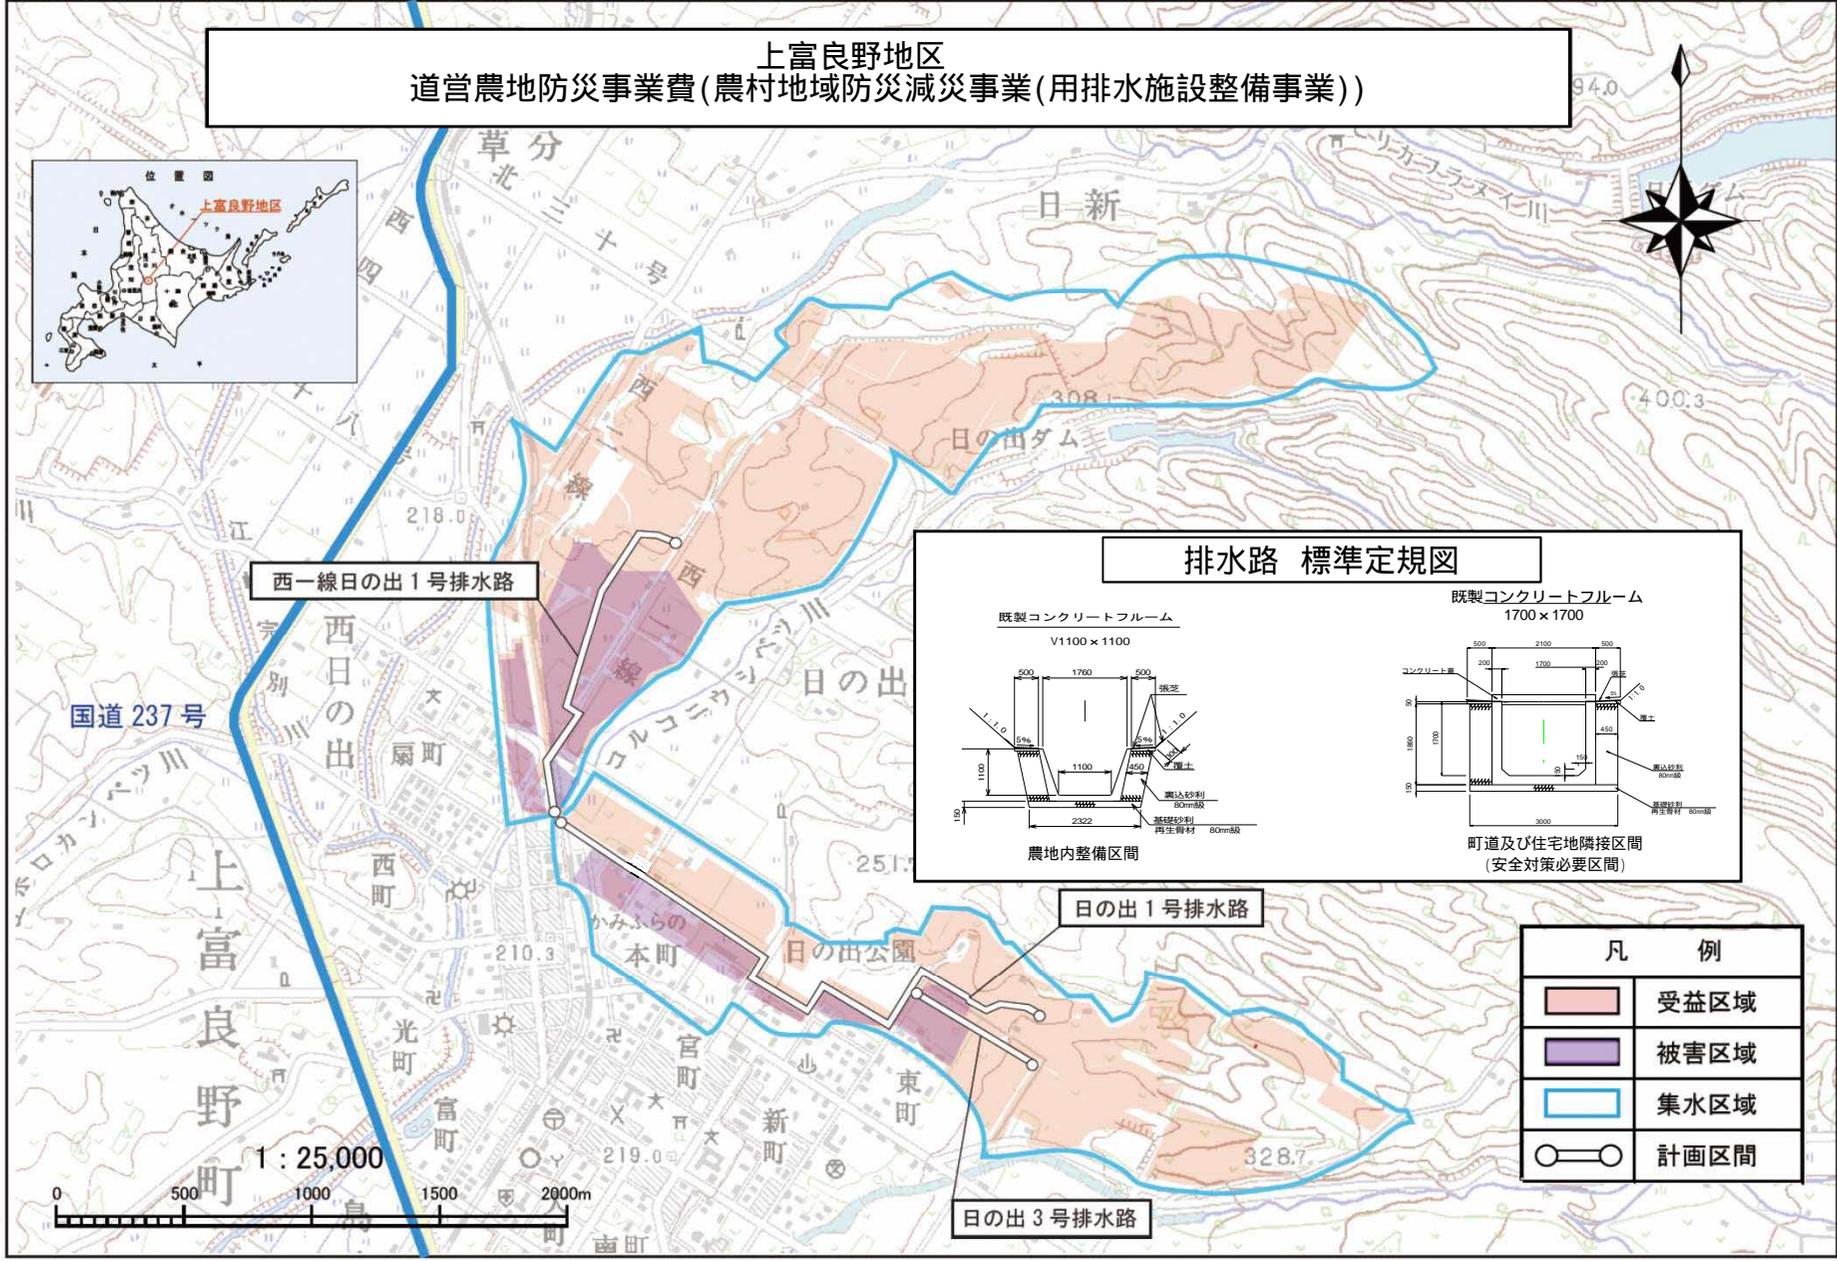

## 排水路 標準定規図

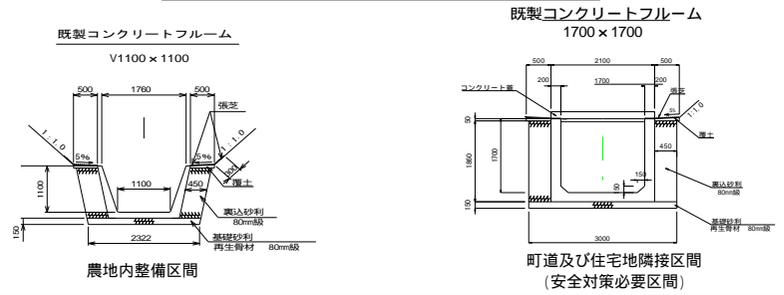

凡 例	
	受益区域
	被害区域
	集水区域
	計画区間

上川総合振興局

